

Nome do Projeto: PIGGY-ME

Product Owner: Calynne Ellen da Silva Jesus e Giovana Rocha e Silva.

Scrum Master: Vítor da Costa Rossi de Oliveira.

Equipe de Desenvolvimento: Isaias Moraes, Cauã Mendes, Rafael Queiroz, Rafael Magalhães, Rodrigo Dutra e Luis Gabriel dos Santos.

Cliente: Giovana Rocha e Silva e Calynne Ellen da Silva Jesus

version[0.3]



Sprint 1 — Planejamento e Estrutura Inicial

Objetivo: Criar e Organizar base inicial do sistema definindo sua estrutura principal e preparando o ambiente de desenvolvimento.

Duração

19/05/2026 até 25/05/2026

Atividades Desenvolvidas

- Definição dos requisitos principais
 - Colocar despesas.
 - Colocar receitas.
 - Definir metas.
 - Gráficos.
 - Tela inicial (home).
 - Menu principal.
 - Integração inicial com MySQL.
- Criação do backlog do produto
- Organização do repositório no GitHub
- Definição da arquitetura do sistema
- Configuração inicial do front-end e back-end
- Criação do banco de dados MySQL

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha	Definição dos requisitos principais	Concluído	ALTA	Entregas
242004546 242004715	Calynne Ellen e Giovana Rocha e Vítor Rossi	Criação do backlog do produto	Concluído	ALTA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Definição da arquitetura do sistema	Concluído	ALTA	Entregas
-	Developers	Organização do repositório no GitHub	Concluído	ALTA	Entregas

242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Configuração inicial do front-end	Concluído	ALTA	Entregas
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Configuração inicial do back-end	Concluído	ALTA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Criação do banco de dados MySQL	Concluído	ALTA	Entregas
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Integração inicial com MySQL	Concluído	ALTA	Entregas
242015497	Isaias Moraes	Tela inicial (home)	Concluído	MÉDIA	Entregas
242032237	Cauã Mendes Coelho	Menu principal	Concluído	MÉDIA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Tela de Login/Cadastro	Concluído	MÉDIA	Entregas

Entregas

- Estrutura inicial do projeto funcionando
- Repositório organizado com estrutura de pastas frontend/backend/banco
- Banco de dados configurado com tabelas principais (usuários, transações, metas)
- Interface inicial criada
- Tela de login criada
- Tela inicial (home) criada
- Menu principal criado
- Backlog do produto concluído

Resultado Esperado

- Concluir Backlog.
- Organização do repositório no GitHub: Repositório criado, estrutura de pastas frontend/backend/banco, todos os membros com acesso
- Configuração inicial do front-end: Projeto rodando e acessível via URL (Vercel ou similar)

- Configuração inicial do back-end: Servidor Node.js deployado no AWS e respondendo a uma requisição básica via URL pública
- Criação do banco de dados MySQL: Banco criado com as tabelas principais (usuários, transações, metas), rodando no AWS RDS ou instância EC2
- Integração inicial com MySQL: Back-end no AWS consegue fazer ao menos uma consulta no banco sem erro
- Tela inicial + Menu principal: Página carrega via URL com navegação básica funcionando
- Tela Login e cadastro: Tela visual criada e abre no navegador

Resultado Final

- Backlog concluído.
- Organização do repositório no GitHub concluída.
- Configuração inicial do front-end: Projeto rodando e acessível via URL localhost:3000 (informado no read me)
- Configuração inicial do back-end: organização da estrutura das pastas back end, iniciais problemas para a Criação do servidor AWS, mas tarefa concluída de maneira esperada.
- Criação do banco de dados MySQL: Banco criado com as tabelas principais, rodando no AWS
- Integração inicial com MySQL: Back-end no AWS consegue fazer consultas no banco sem erro, Manteve-se o padrão arquitetural esperado, sintaxe do código de fácil entendimento.
- Tela inicial + Menu principal: Página carrega via URL com navegação básica funcionando (falta implementar lógica dos botões), o css está organizado assim como o código do HTML mas falta design responsivo.
- Tela Login e cadastro: Design da tela de login e cadastro ficaram de acordo com o exemplo esperado.

Sprint 1 Retrospective

Problema

Quase unânime que a organização de tempo foi ruim.


Melhoria para próxima sprint:

melhorar gestão do tempo.


Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	(tarefas concluídas / tarefas planejadas)x 100	%	>= 80%	100%
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	total de dias de atraso / n tarefas atrasadas	Dias	<= 3 dias	0.5 dia
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas entregues por sprint	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente	11

Metas visuais

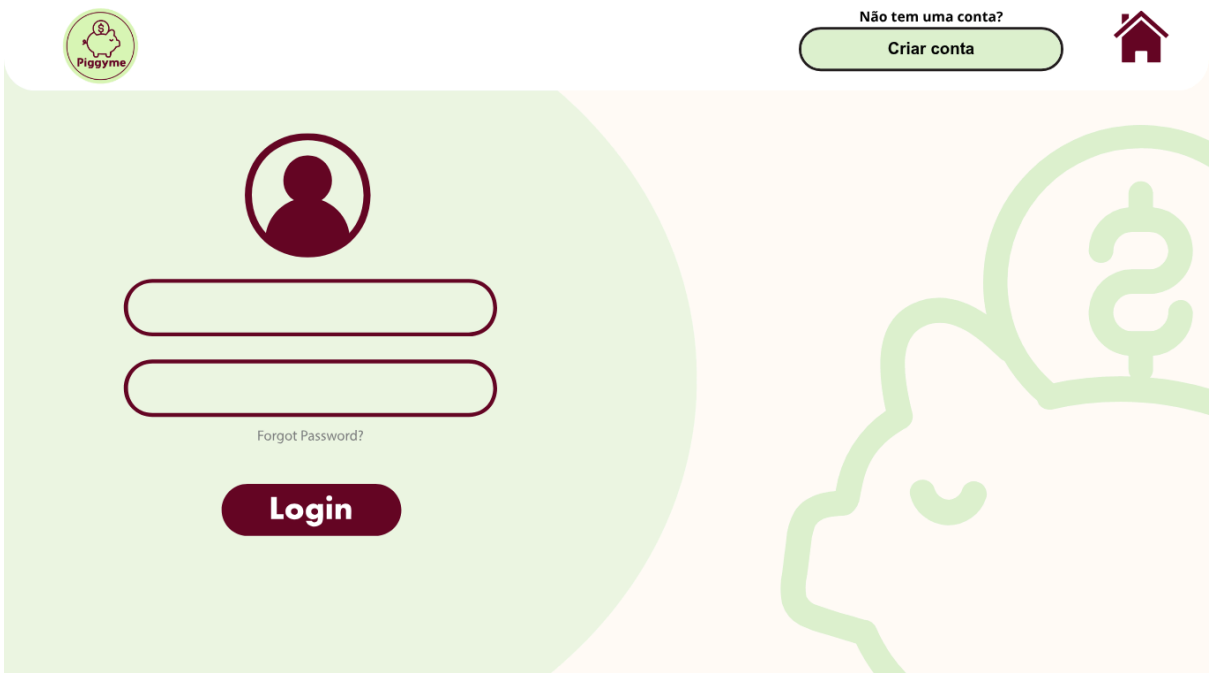

Tela de login

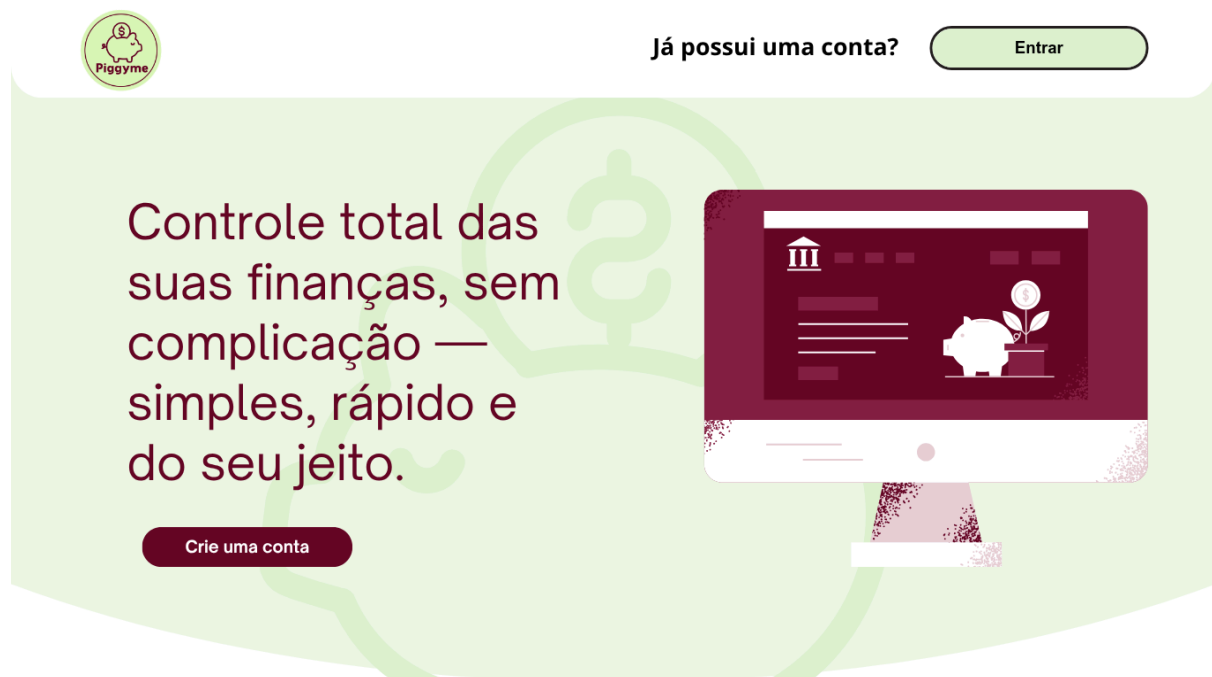

Tela inicial(home)



Tela principal (Menu Principal)

Sprint 2 — Sistema de Usuários

Objetivo: desenvolver autenticação e gerenciamento de usuários e iniciar a tela principal.

Duração

25/05/2026 até 07/06/2026

Atividades

- Backend cadastro de usuários
- Backend de login
- Validação de autenticação
- Recuperação básica de senha
- Integração cadastro com banco de dados
- Segurança de cadastro com tokens
- Testes das funcionalidades de acesso
- Reestruturação da Tela Principal
- Iniciar a tela de adicionar gastos e receitas

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Backend cadastro de usuários	Concluído	ALTA	Entregas
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Backend de login	Concluído	ALTA	Entregas
242032237 211063004	Cauã Mendes Coelho Rafael Magalhães Merenciano	Validação de autenticação	Concluído	ALTA	Entregas
242015951 211063004	Rodrigo Dutra Ferreira Rafael Magalhães Merenciano	Segurança de cadastro com tokens JWT	Concluído	ALTA	Entregas
242032237 211063004	Cauã Mendes Coelho Rafael Magalhães Merenciano	Integração cadastro com banco de dados	Concluído	ALTA	Entregas
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Recuperação básica de senha	Concluído	ALTA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Reestruturação da Tela Principal	Concluído	ALTA	Entregas

242015497	Isaias Moraes	Gamificação (estrutura inicial)	Concluído	ALTA	Entregas
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	tela add receitas	Concluído	MÉDIA	Entregas
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	tela add gastos	Concluído	MÉDIA	Entregas

Entregas

- Cadastro e login funcionando
- Usuários armazenados no banco de dados
- Sistema de autenticação ativo com tokens JWT
- Recuperação básica de senha implementada
- Gamificação com estrutura inicial de XP funcionando
- Tela principal reestruturada
- Tela de adicionar receita criada
- Tela de adicionar gasto criada

Resultados Esperados

- Backend de cadastro de usuários: Endpoint recebe nome, e-mail e senha, valida os dados e armazena o novo usuário no banco MySQL
- Backend de login: Endpoint recebe e-mail e senha, valida as credenciais e **retorna um token JWT ao cliente**
- Validação de autenticação: Middleware implementado verificando o token JWT em todas as rotas protegidas, rejeitando requisições sem token válido
- Segurança com tokens JWT: Tokens gerados com prazo de expiração definido, senhas armazenadas com hash (bcrypt ou similar), sem dados sensíveis em texto puro no banco
- Recuperação básica de senha: Endpoint recebe o e-mail do usuário e envia um link/código de redefinição por e-mail
- Integração cadastro com banco: Fluxo completo funcionando usuário se cadastra no frontend,
- Gamificação (estrutura inicial): Estrutura básica implementada - endpoint para salvar e atualizar pontuação XP do usuário, com dados persistindo no banco MySQL
- Reestruturação da Tela Principal: Interface atualizada conforme meta visual da sprint(imagem abaixo).
- Telas add despesas e receitas: Tela existe e abre, mesmo que sem funcionalidade completa

Metas visuais

Link da pasta com todos os elementos e metas visuais:

<https://drive.google.com/drive/folders/1dMccwSS9Q52O9k0Hotes4l8T64acAPuH?hl=pt-br>



S

Refinação da tela principal (obs: no lugar de “Ver relatórios” colocar “Registrar receita”)



Tela de adicionar gasto



Tela de adicionar receita

Resultados Finais

- Backend de cadastro de usuários: Endpoint recebe nome, e-mail e senha, valida os dados e armazena o novo usuário no banco MySQL, os resultados de cadastro do usuário estão definidos
- O back-end de login apresenta os resultados esperados de acordo com os testes realizados
- A parte de validação de autenticação aparenta estar bem estruturada, de acordo com os resultados esperados, mas provavelmente teremos que manter futuramente.
- Segurança com tokens JWT: Tokens gerados com prazo de expiração definido, senhas armazenadas com hash (bcrypt ou similar), sem dados sensíveis em texto puro no banco mas Faltou testar os endpoints após concluir :autenticação com token JWT
- Recuperação básica de senha: Front e Back end da recuperação de senha feitos, resultado funcional e testado. Faltou terminar o fluxo da redefinição de senha após o recebimento do email pelo usuário.
- Integração cadastro com banco: Fluxo completo funcionando usuário se cadastra no frontend, dado persiste no MySQL e é recuperável via consulta
- Gamificação (estrutura inicial): Estrutura básica implementada Foi criada toda estrutura inicial para gamificação já conectada com banco de dados.
- Reestruturação da Tela Principal: Interface atualizada conforme meta visual da sprint.
- Atualização da tela final com pendências a rotas ainda não criadas, falta integrar gamificação.

Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas planejadas}) \times 100$	%	$\geq 80\%$	90%
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	$\text{total de dias de atraso} / n \text{ tarefas atrasadas}$	Dias	$\leq 3 \text{ dias}$	0 dia
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas entregues por sprint	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente	10

Tabela 12 - Métricas de Qualidade do Software

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	
Total de bugs	Quantidade	Soma dos bugs	Quantidade	Baixo	
Bugs críticos	Falhas graves	Contagem direta	Quantidade	0	
taxa de correção	Percentual de bugs resolvidos	$(\text{Bugs corrigidos} / \text{Bugs encontrados}) \times 100$	%	$\geq 90\%$	

Tabela 13 - Métricas de Desempenho

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	
Tempo de resposta	Tempo médio para carregar páginas	soma dos tempos / n testes	Segundos	$\leq 2s$	
Tempo de login	Tempo para autenticação	média dos testes	Segundos	$\leq 2s$	

Tabela 14 - Métricas de Usabilidade

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	
Satisfação do usuário	Nota atribuída após teste	Média das notas	0 a 10	Baixo	
Taxa de sucesso	Tarefas concluídas corretamente	$(\text{tarefas concluídas} / \text{tarefas testadas}) \times 100$	%	0	
Facilidade de uso	Tempo para realizar tarefa simples	Média dos testes	Minutos	$\leq 2 \text{ min}$	

Retrospectiva da Sprint 2

Problema: A alta interdependência entre as tarefas gerou problemas. O início de atividades sem a conclusão das etapas prévias resultou em atrasos e retrabalho.

Melhoria para a próxima sprint: Otimizar o sequenciamento das tarefas e fortalecer a comunicação entre os desenvolvedores através da implementação de "ondas" (sub-sprints), visando uma melhor organização dos fluxos de trabalho.

Feedback da Equipe:

- Os testes e avaliações seriam mais eficientes se o módulo de login estivesse finalizado previamente.
- As interdependências desorganizadas exigiram alterações constantes em múltiplos arquivos, comprometendo a completude das tarefas e criando o risco de desestabilizar funcionalidades já existentes.
- O progresso foi impactado pela dependência de entregas de terceiros e pela ausência de uma validação final dos endpoints.

Sprint 3 — Controle Financeiro

Objetivo: refinar gerenciamento de gastos e receitas (Correção de bugs, otimização de desempenho, melhorias).

Duração: 07/06/2006 até 14/06/2026

Atividades

- Refinação do cadastro de despesas
- Refinação do cadastro de receitas
- Cadastro de metas
- Tela de metas
- Edição e exclusão de registros
- Organização por categorias
- Criação de categorias
- Exibição do histórico financeiro
- Validação de dados financeiros

Entregas

- Controle financeiro funcionando
- Histórico de movimentações disponível
- Organização por categorias implementada

Com base no sprint review o scrum master decidiu dividir a sprint em ondas de entrega:

Onda 1 — Base (dias 1-2, até 10/06)

Onda 2 — Integração (dias 3-5, até 12/06)

Onda 3 — Refinação (dias 6-7, até 14/06)

Matrícula	Nome	Tarefa	Status	Prioridade	Situação	Onda
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	Resolver pendências de integração na sprint 2 (token)	PENDENTE	CRÍTICA	Desenvolvimento	1
242032237	Cauã Mendes Coelho	Backend CRUD de metas	PENDENTE	CRÍTICA	Desenvolvimento	1
242015497	Isaias Moraes	persistência de gastos no banco	PENDENTE	ALTA	Desenvolvimento	1
242015497	Isaias Moraes	persistência de receitas no banco	PENDENTE	ALTA	Desenvolvimento	1
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Tela de metas (front)	PENDENTE	ALTA	Desenvolvimento	2
242015906	Luis Gabriel dos Santos Galeno	Integrar gamificação ao menu + XP ao salvar gasto/receita	PENDENTE	ALTA	Desenvolvimento	2
211063004	Rafael Magalhães Merenciano	Dashboard com saldo, receitas e despesas do mês	PENDENTE	ALTA	Desenvolvimento	2
242015399	Rafael Araujo Queiroz	Exibição do histórico financeiro (frontend + endpoint)	PENDENTE	ALTA	Desenvolvimento	2
242015951	Rodrigo Dutra Ferreira	criação de categorias	PENDENTE	MÉDIA	Desenvolvimento	3
242032237	Cauã Mendes Coelho	Edição e exclusão de registros de gastos e receitas	PENDENTE	MÉDIA	Desenvolvimento	3

Resultados esperados

Onda 1

- Resolver pendências de integração Sprint 2 (token): Merge da branch developer na main realizado, autenticação JWT funcionando de ponta a ponta; login gerando token, rotas protegidas rejeitando requisições sem token válido
- Backend CRUD de metas: Endpoints funcionais para criar, listar e atualizar progresso de metas, com dados persistindo no banco MySQL
- Persistência de gastos no banco: Endpoint POST recebe descrição, valor, categoria e data, valida os dados e armazena a transação do tipo despesa na tabela transacoes vinculada ao usuário autenticado
- Persistência de receitas no banco: Endpoint POST recebe descrição e valor, valida os dados e armazena a transação do tipo receita na tabela transacoes vinculada ao usuário autenticado

Onda 2

- Tela de metas (frontend): Tela carrega via URL, exibe metas cadastradas com progresso visual e permite criar nova meta através de formulário conectado ao backend
- Integrar gamificação ao menu + XP ao salvar gasto/receita: Card de XP e nível no menu exibe dados reais do banco; ao salvar um gasto ou receita o usuário recebe XP e o toast de confirmação aparece na tela
- Dashboard com saldo, receitas e despesas do mês: Painel exibe saldo atual calculado a partir das transações reais do banco, com totais de receitas e despesas do mês corrente
- Exibição do histórico financeiro (frontend + endpoint): Endpoint retorna lista de transações do usuário ordenadas por data; tela exibe o histórico com descrição, valor, categoria e data de cada registro

Onda 3

- Criação de categorias: Usuário consegue criar categorias personalizadas que aparecem no select ao registrar gasto ou receita
- Edição e exclusão de registros: Usuário consegue editar descrição, valor e categoria de um registro existente ou excluí-lo, com atualização imediata no histórico e no saldo do dashboard

Metas visuais



Resultados Finais

xxx

Métricas de Acompanhamento do Projeto

Métrica	Definição	Forma de Cálculo	Unidade	Valor esperado	Valor Obtido
Taxa de conclusão da sprint	Percentual de tarefas concluídas na sprint	(tarefas concluídas / tarefas planejadas)x 100	%	>= 80%	%
Atraso médio	Média de atrasos das tarefas finalizadas	total de dias de atraso / n tarefas atrasadas	Dias	<= 3 dias	dia
Velocidade da equipe	Quantidade de tarefas entregues por sprint	Total de tarefas concluídas	Tarefas	Crescente	10
